

Uprava
Univerze v Ljubljani

Univerza v Ljubljani

p.p. 362, Kongresni trg 12
1001 Ljubljana, Slovenija
telefon: 01 241 85 00
faks: 01 241 86 60
www.uni-lj.si

UNIVERZA V LJUBLJANI
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje

Znak, del, št.	25-07-2007	Rešil
716/07	Priloge - vrednote	DE PROJE Skala



AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST IN
OBLIKOVANJE
Erjavčeva ul. 23

1000 LJUBLJANA

Številka: 700-05/07 BA/ag
Datum: 24.7.2007

ZADEVA: Gradnja Akademij

V prilogi vam pošiljamo Terminski plan za Akademije.

Lep pozdrav,

Anja Gomizelj
samostojna svetovalka za investicije


Anja Gomizelj




Priloga:
kot v tekstu

Objekt: Akademije v Ljubljani
Investitor: Univerza Ljubljana

Terminski plan: Izdelava projektne in prostorske dokumentacije

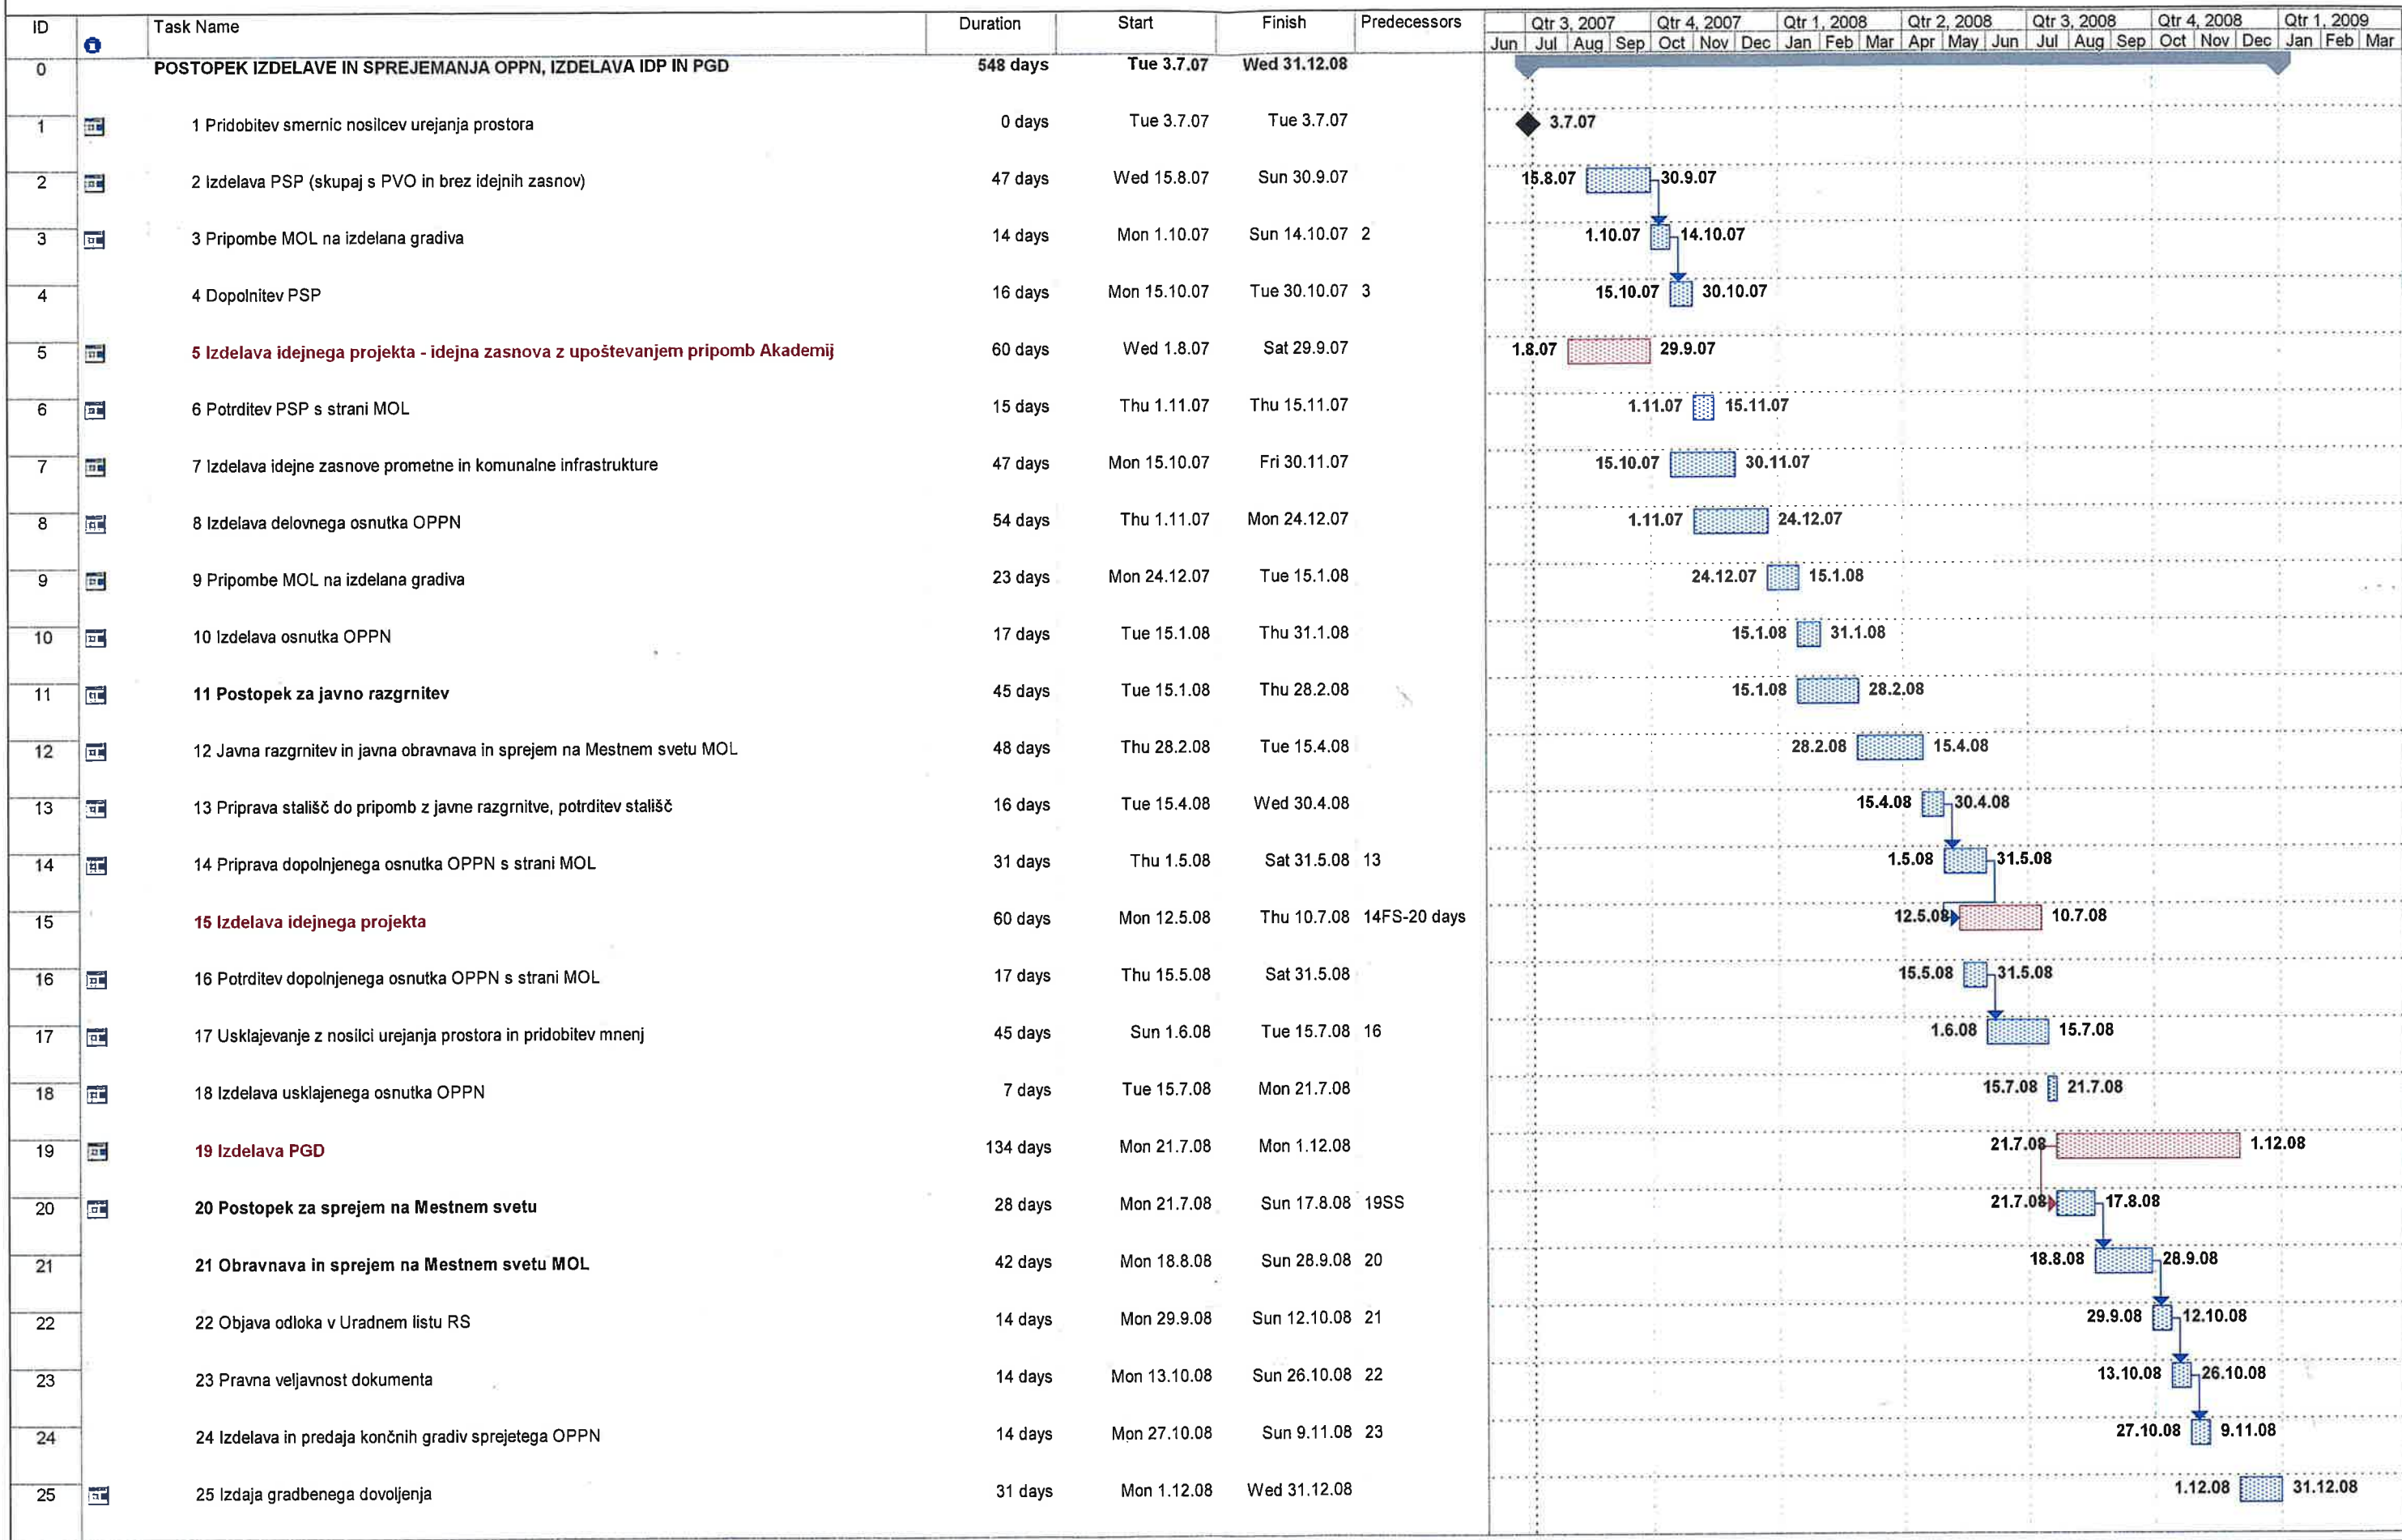



**AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST
IN OBLIKOVANJE**
Erjavčeva ul. 23

1000 LJUBLJANA

Številka: 700-05/07-SM
Datum: 26.07.2007

Zadeva: Terminski plan

Spoštovani,

V prilogi vam pošiljamo terminski plan izdelave projektne in tehnične dokumentacije za objekt treh akademij na Roški cesti v Ljubljani.

Lepo Vas pozdravljamo,



Slobodan Milojević, univ.dipl.ing.arh.
Vodja službe za gospodarjenje s premoženjem

Priloga:
- kot v tekstu

Objekt: Akademije v Ljubljani
Investitor: Univerza Ljubljana

Terminski plan: Izdelava projektne in prostorske dokumentacije

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Qtr 3, 2007			Qtr 4, 2007			Qtr 1, 2008			Qtr 2, 2008			Qtr 3, 2008			Qtr 4, 2008			Qtr 1, 2009					
						Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar		
0	POSTOPEK IZDELAVE IN SPREJEMANJA OPPN, IZDELAVA IDP IN PGD	548 days	Tue 3.7.07	Wed 31.12.08																									
1	1 Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora	0 days	Tue 3.7.07	Tue 3.7.07																									
2	2 Izdelava PSP (skupaj s PVO in brez idejnih zasnov)	47 days	Wed 15.8.07	Sun 30.9.07																									
3	3 Pripombe MOL na izdelana gradiva	14 days	Mon 1.10.07	Sun 14.10.07	2																								
4	4 Dopolnitev PSP	16 days	Mon 15.10.07	Tue 30.10.07	3																								
5	5 Izdelava idejnega projekta - idejna zasnova z upoštevanjem pripomb Akademij	60 days	Wed 1.8.07	Sat 29.9.07																									
6	6 Potrditev PSP s strani MOL	15 days	Thu 1.11.07	Thu 15.11.07																									
7	7 Izdelava idejne zasnove prometne in komunalne infrastrukture	47 days	Mon 15.10.07	Fri 30.11.07																									
8	8 Izdelava delovnega osnutka OPPN	54 days	Thu 1.11.07	Mon 24.12.07																									
9	9 Pripombe MOL na izdelana gradiva	23 days	Mon 24.12.07	Tue 15.1.08																									
10	10 Izdelava osnutka OPPN	17 days	Tue 15.1.08	Thu 31.1.08																									
11	11 Postopek za javno razgrnitev	45 days	Tue 15.1.08	Thu 28.2.08																									
12	12 Javna razgrnitev in javna obravnava in sprejem na Mestnem svetu MOL	48 days	Thu 28.2.08	Tue 15.4.08																									
13	13 Priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve, potrditev stališč	16 days	Tue 15.4.08	Wed 30.4.08																									
14	14 Priprava dopolnjenega osnutka OPPN s strani MOL	31 days	Thu 1.5.08	Sat 31.5.08	13																								
15	15 Izdelava idejnega projekta	60 days	Mon 12.5.08	Thu 10.7.08	14FS-20 days																								
16	16 Potrditev dopolnjenega osnutka OPPN s strani MOL	17 days	Thu 15.5.08	Sat 31.5.08																									
17	17 Usklajevanje z nosilci urejanja prostora in pridobitev mnenj	45 days	Sun 1.6.08	Tue 15.7.08	16																								
18	18 Izdelava usklajenega osnutka OPPN	7 days	Tue 15.7.08	Mon 21.7.08																									
19	19 Izdelava PGD	134 days	Mon 21.7.08	Mon 1.12.08																									
20	20 Postopek za sprejem na Mestnem svetu	28 days	Mon 21.7.08	Sun 17.8.08	19SS																								
21	21 Obravnava in sprejem na Mestnem svetu MOL	42 days	Mon 18.8.08	Sun 28.9.08	20																								
22	22 Objava odloka v Uradnem listu RS	14 days	Mon 29.9.08	Sun 12.10.08	21																								
23	23 Pravna veljavnost dokumenta	14 days	Mon 13.10.08	Sun 26.10.08	22																								
24	24 Izdelava in predaja končnih gradiv sprejetega OPPN	14 days	Mon 27.10.08	Sun 9.11.08	23																								
25	25 Izdaja gradbenega dovoljenja	31 days	Mon 1.12.08	Wed 31.12.08																									
